

## 一般国道403号三条北道路 新川1号支線排水路ボックスカルバート工事


作成日 令和3年4月号  
発注者 三条地域振興局地域整備部  
施工 大河津・氏田経常共同企業体

皆様におかれましては、日頃より道路行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。

これから施工する新川1号支線排水路ボックスカルバート工事の進捗状況を今後報告していきます。

初めに、工事は以下のような流れで進みます。

- |        |            |  |       |
|--------|------------|--|-------|
| ステップ1: | 仮設排水路設置    | 新川排水路を迂回させるため、土水路で排水路を設置します。               | 施工準備中 |
| ↓      |            |  |       |
| ステップ2: | コンクリート杭打ち  | ボックスカルバート設置箇所は地盤が軟弱なため、杭を打ち込んで頑丈にします。      | 未工    |
| ↓      |            |  |       |
| ステップ3: | ボックスカルバート工 | 100tクレーンでボックスカルバートを設置します。                  | 未工    |
| ↓      |            |  |       |
| ステップ4: | 取付護岸工      | ブロック積護岸で既設のU型側溝に合致するように施工します。              | 未工    |
| ↓      |            |  |       |
| ステップ5: | 仮設排水路撤去工   | 取付護岸工と新川排水路（幅2500×高1500）を接続し、仮設の排水路を撤去します。 | 未工    |

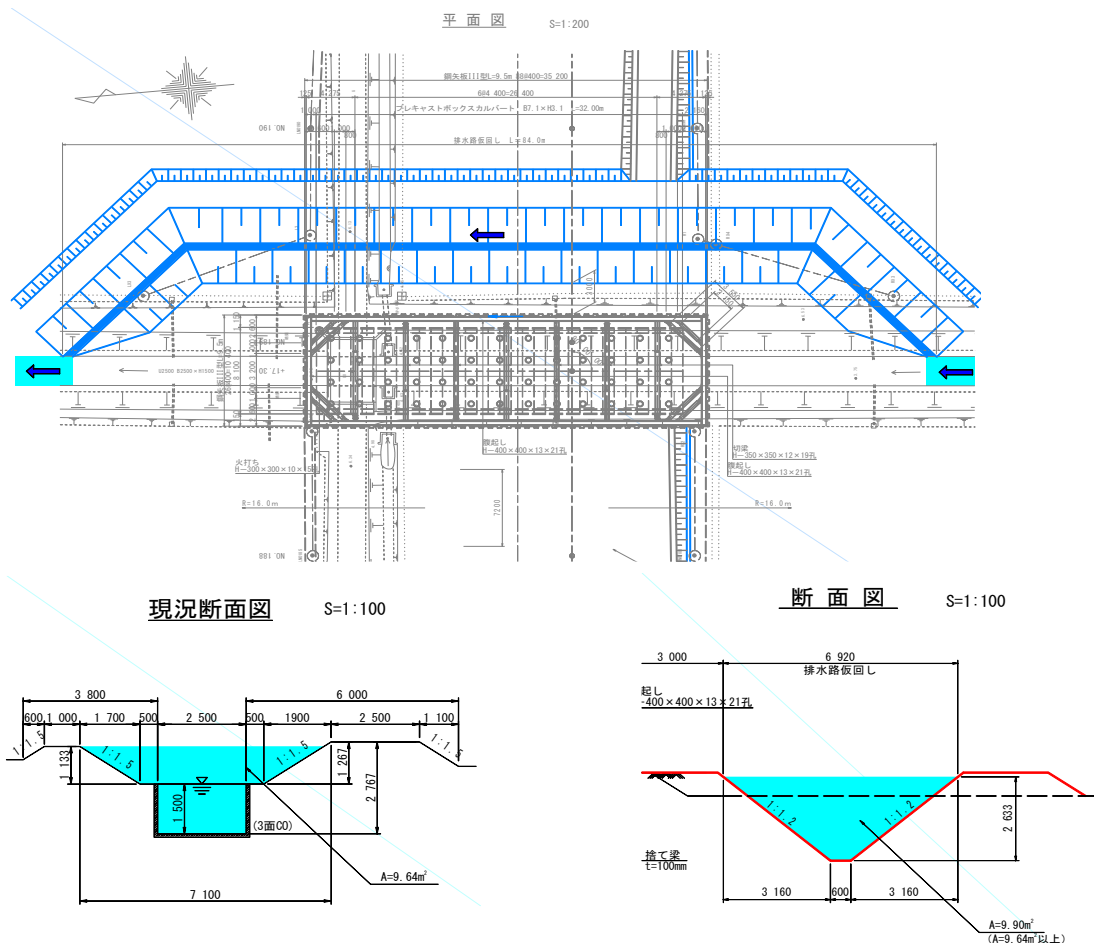

～私たちの町を守り、造り、未来へ～

※何かお気づきの点がありましたら、作業所までご連絡ください。
